

令和 6 年度

公 共 事 業

備 品 購 入 設 計 書


山江村

村 長	副 村 長	総務課長	主 幹	係 長	主 査	課 員	精 算 者	設 計 者	
工 期	自 契約の次の平日 至 令和7年3月31日					摘 要			
番 号	山総備購第2号								
履 行 場 所	山江村大字山田字五反田地内								
事 業 名	令和6年度 備蓄倉庫購入事業								
設 計 金 額	金 円也								
概 要	備蓄倉庫 2基 ・ W5260×D1790×H2385 ・ 扉タイプ ・ ハイルーフ ・ 側面棚Aセット ・ 基礎ブロック 21個 ・ 転倒防止工事								

設 計 内 訳 書

No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1	物置倉庫	扉タイプ ハイルーフ W5260×D1790×H2385	2	基		0	伊ハ [®] フォルダプラス FP-5218HT 一般型
2	雨とい		2	セット		0	
3	別売り棚	Aセット3段	2	セット		0	オプション 別売棚
4	ブロック4寸据付け		42	箇所		0	モルタルベース
5	転倒防止工事		12	箇所		0	床掘・ コンクリート共
6	物置施工費		2	台		0	
7	産廃処理費		1	式		0	
						0	
	小 計					0	
						0	消費税抜き 千円止め
	運搬費		1	式		0	
	諸経费率費		1	式	0	0	
	工事価格					0	
	消費税		10.0	%		0	
	合 計					0	

No 1

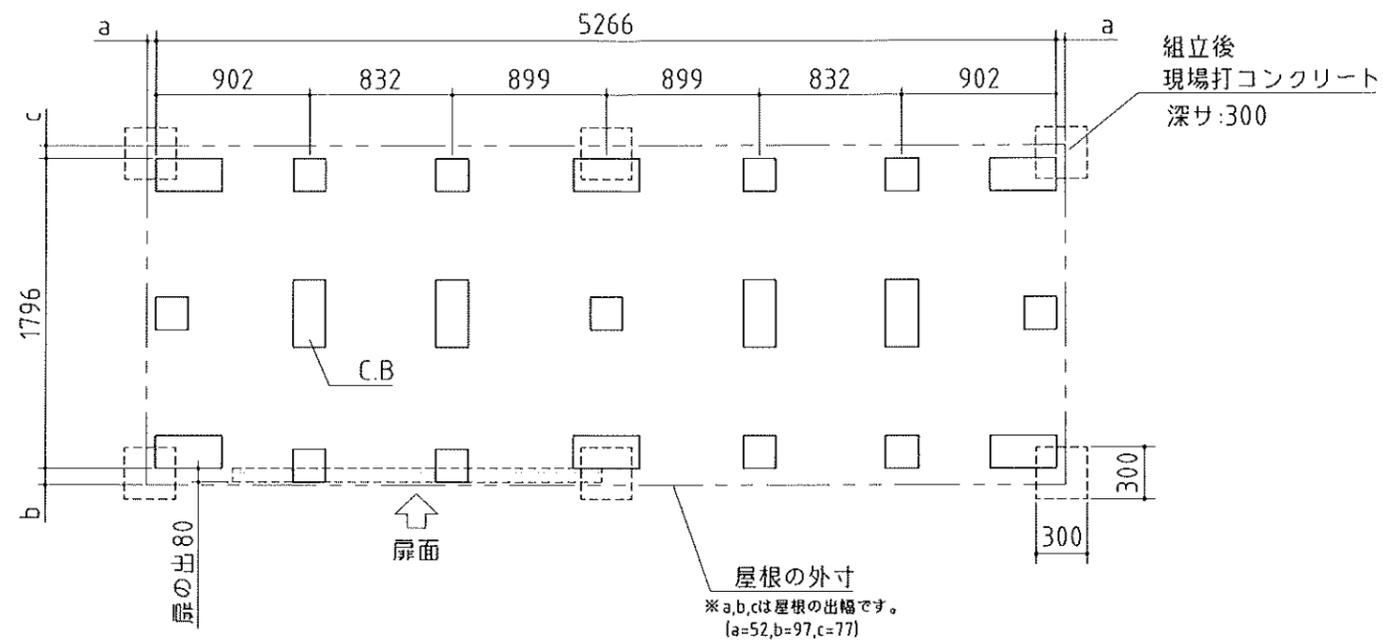


基礎詳細	アンカー部詳細		
	地盤が土の場合	地盤がコンクリートの場合 ※オールアンカーM10(市販品)が6本必要になります	
	<p>A寸法: 100~150mmに対応</p>	<p>B寸法: 100~120mmに対応</p>	<p>C寸法: 140~175,190mmに対応</p>

基礎図


〈縮尺〉 S=1/40
~一般型・多雪型~

機種名 **FP-5218HT**


※寒冷地等は地域の実情に合わせた基礎にしてください。

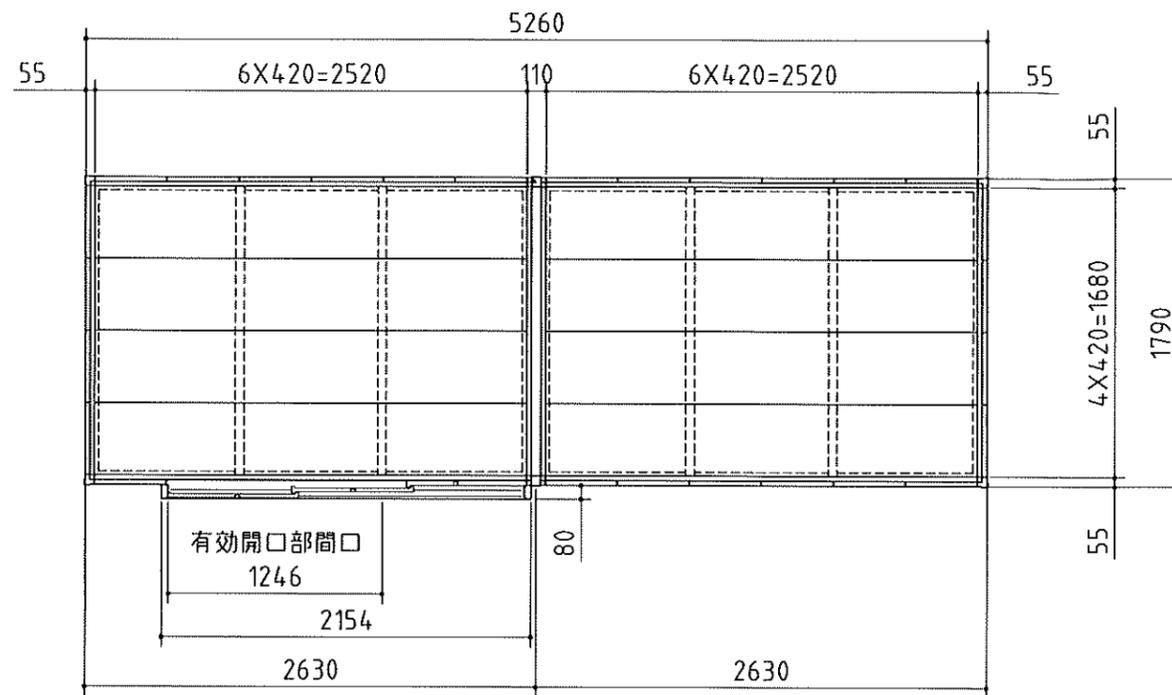

平面図

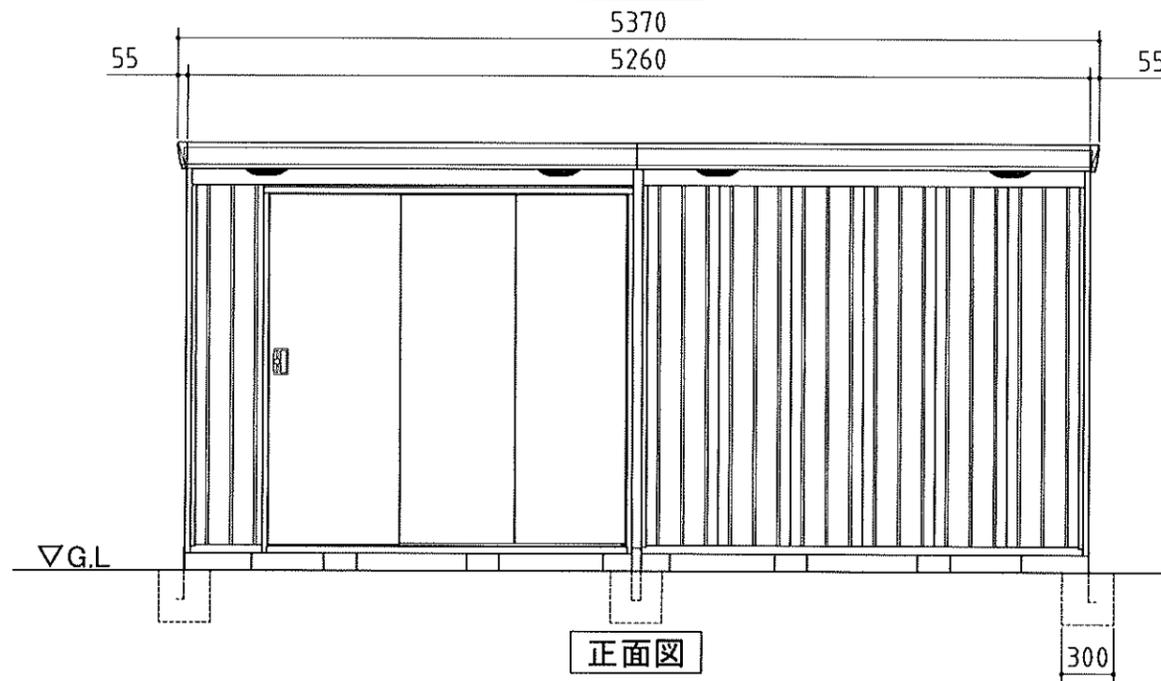

正面図

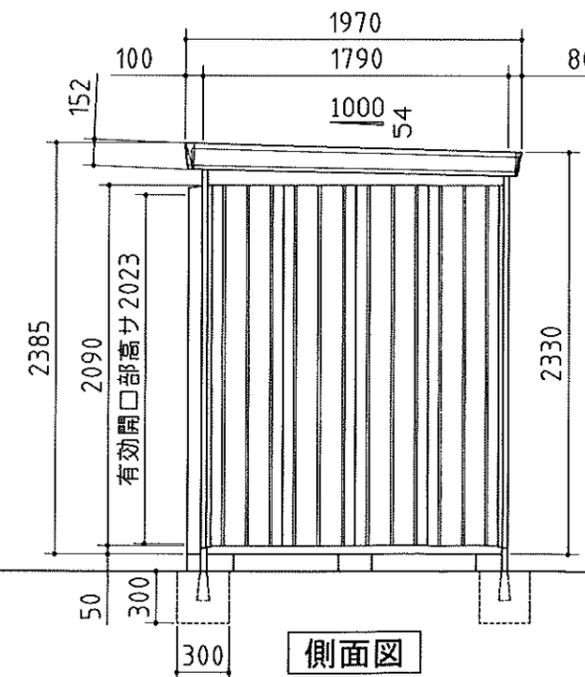

側面図

品番	部品名	材料(材質)	板厚(mm)
1	土台取付板	SGMH400 K27	2.3
2	土台	SGC400 F12	1.2
3	根太	SGCC F12	1.2
4	柱	SGC400 F12	1.2
5	床パネル	SGCC F12	1.0
6	桁前	SZAC400 Y10	1.0
7	桁後	SZAC400 Y10	1.0
8	妻板左右	SZAC400 Y10	0.7
9	梁中(奥行1790mm)	SZAC400 Y10	1.0
		SGC400 F12	1.0
		SGH400 F12	1.6
10	鼻隠シ前後	SZACC Y10	0.7
11	屋根パネル	SZAC400 Y10	0.5
12	母屋中(2630mm)一般型	SGC400 F12	1.2
13	壁パネル	SGC400 F12	0.7
14	内壁	発泡ポリプロピレン	
15	天井	発泡ポリプロピレン	
16	壁面扉鴨居	SGC400 F12	0.7
17	壁面扉敷居	SGCC F12	1.0
18	壁面扉枠左右	SGC400 F12	1.0
19	正面パネル	SGC400 F12	0.7
20	扉	SGCC F12	0.8
21	アンカープレート	SGHC F12	2.3
SGMH400: 溶融亜鉛-アルミニウム-マグネシウム合金めっき鋼板 (JIS G 3323)			
SGC400,SGCC,SGH400,SGHC: 溶融亜鉛めっき鋼板 (JIS G 3302)			
SZAC400,SZACC: 溶融亜鉛-5%アルミニウム合金めっき鋼板 (JIS G 3317)			

外形図

<縮尺> S=1/40
~一般型~

機種名 FP-5218HT

- 有効開口寸法: 1246×2023(mm)
- 床面積: 9.42㎡(2.85坪)

